

RESOLUCION Nº 613


OBRA: "DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN ALBERGUE ESC. Nº 4.463 EL SALADILLO " PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES ADICIONAL Nº 1

88

Nº Item	Descripcion	Incid. %	15 Días	30 Días	45 Días
1	DEMOLICIONES, DESMONTAJE Y RETIRO DE MATERIAL	0,09%	100,00%		
			0,09%		
2	MOVIMIENTO DE SUELOS	1,35%	100,00%		
			1,35%		
3	FUNDACIONES	3,80%	100,00%		
			3,80%		
4	ESTRUCTURA RESISTENTE	10,49%	70,00%	30,00%	
			7,34%	3,15%	
5	AISLACIONES	2,06%	30,00%	70,00%	
			0,62%	1,44%	
6	CERRAMIENTOS - EXTERIORES E INTERIORES	9,50%	30,00%	70,00%	
			2,85%	6,65%	
7	REVOQUES	9,57%		70,00%	30,00%
				6,70%	2,87%
8	CIELORRASOS	6,63%			100,00%
					6,63%
9	SOLADOS	7,12%		100,00%	
				7,12%	
10	ZÓCALOS, UMBRALES y ANTEPECHOS	1,36%		100,00%	
				1,36%	
11	CARPINTERÍAS	38,23%		50,00%	50,00%
				19,12%	19,12%
12	PINTURAS	8,21%		50,00%	50,00%
				4,10%	4,10%
13	VARIOS	15,12%	10,00%	40,00%	50,00%
			1,51%	6,05%	7,56%
14	ECONOMÍAS OBRA ESC Nº 4463 SALADILLO	-13,53%	40,00%	40,00%	20,00%
			-5,41%	-5,41%	-2,71%

	100,00%			
PORCENTAJE MENSUAL		12,15%	50,28%	37,58%
PORCENTAJE ACUMULADO		12,15%	62,42%	100,00%
INVERSION MENSUAL		\$ 148.474,19	\$ 614.452,85	\$ 459.244,18
INVERSION ACUMULADA		\$ 148.474,19	\$ 762.927,04	\$ 1.222.171,22

PLAN DE TRABAJOS

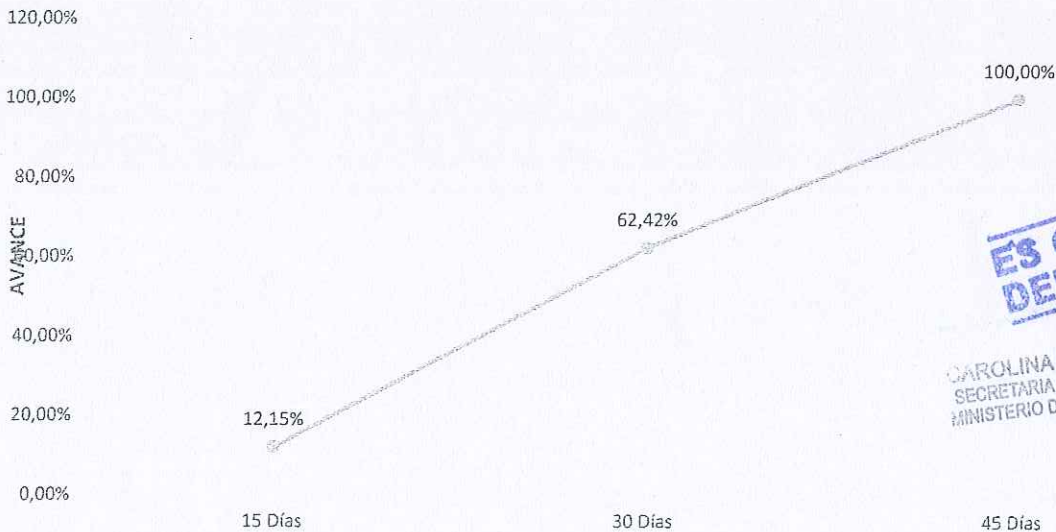

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CAROLINA SUZANA RUSSO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

[Signature]
CELMONT S.R.L.
Construcciones y Servicios
JAQUELINA MONTERO
SOCIA GERENTE

CURVA DE INVERSIONES

RESOLUCION Nº 613



89

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

CAROLINA SUAREZ RUSSO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA

[Signature]
CELMONT S.R.L.
Construcciones y Servicios
JANUELINA MONTERO
ECONOMISTA
